ean universidad | educación continua

UNIVERSIDAD EAN · EDUCACIÓN CONTINUA

Liderazgo para el Diálogo Ambiental y la Sostenibilidad Territorial

Propuesta técnica, metodológica y económica · Convenio 25-101 FPV ZAP II



510 líderes

17 municipios PDET

40 horas

7 meses

Panel con IA

Instituto Alexander von Humboldt

Bogotá D.C., 13 de octubre de 2026

1 · ANTECEDENTES Y MARCO DEL CONVENIO

Del convenio marco a 510 líderes en el territorio

CONVENIO NO. 123 DE 2025

$44.747.999.248

Instituto Humboldt y Fiducoldex, vocera del Patrimonio Autónomo **Fondo Colombia en Paz**.

→

COMPONENTE 2

$12.327.318.551

Fortalecimiento de la **gobernanza ambiental territorial** y del diálogo socioambiental en territorios PDET.

→

ACTIVIDAD 2.1.5

$2.781.879.658

Formación y certificación de líderes comunitarios en **Caquetá, Meta y Guaviare**.

→

CONVENIO 25-101 FPV ZAP II

510

líderes certificados en 17 municipios PDET

La propuesta de la Universidad EAN.

Coherencia total: objetivos, alcance y población beneficiaria alineados con el convenio principal, con trazabilidad entre lo que el Instituto compromete y lo que se ejecuta en campo.

2 · RESUMEN EJECUTIVO Y FICHA TÉCNICA

Una intervención pedagógica y social estratégica

510
líderes y lideresas comunitarias

17
municipios PDET de la Amazonía y la Orinoquía

40
horas académicas por municipio

7
meses de ejecución continua

ENTIDAD PROPONENTE
Universidad EAN
Acreditada en Alta Calidad · QS Rated Excellent

ENTIDAD DESTINATARIA
Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt

ASESORÍA TÉCNICA PRINCIPAL
Brigitte Baptiste
Dirección científica y estratégica

COBERTURA Y META
510 líderes comunitarios
Caquetá, Meta y Guaviare

VALOR TOTAL GLOBAL
$1.086.430.500 COP
Componente académico y logística integral

COMPONENTE ACADÉMICO FIJO
$680.650.000 COP
Exento de IVA · Art. 476-6 Estatuto Tributario

3 · RESPALDO INSTITUCIONAL

Rigor científico e innovación educativa, con Brigitte Baptiste

BB

Brigitte Baptiste

Asesora técnica principal · Dirección científica y estratégica

Lideró cerca de una década el Instituto Humboldt y luego la Rectoría de la Universidad EAN: el puente entre la investigación en biodiversidad, la gobernanza ambiental participativa y el desarrollo territorial sostenible.

Acreditación de Alta Calidad

Ministerio de Educación Nacional, Res. 023654, y calificación internacional QS Rated Excellent.

Más de 19.000 formados


Profesionales y líderes comunitarios en educación continua alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Sello de sostenibilidad EAN

Emprendimiento sostenible, gestión ambiental activa y reconocimiento de las dinámicas de la frontera agrícola.

4 · ESTRATEGIA OPERATIVA Y DIMENSIONAMIENTO

17 municipios PDET en 5 grupos territoriales

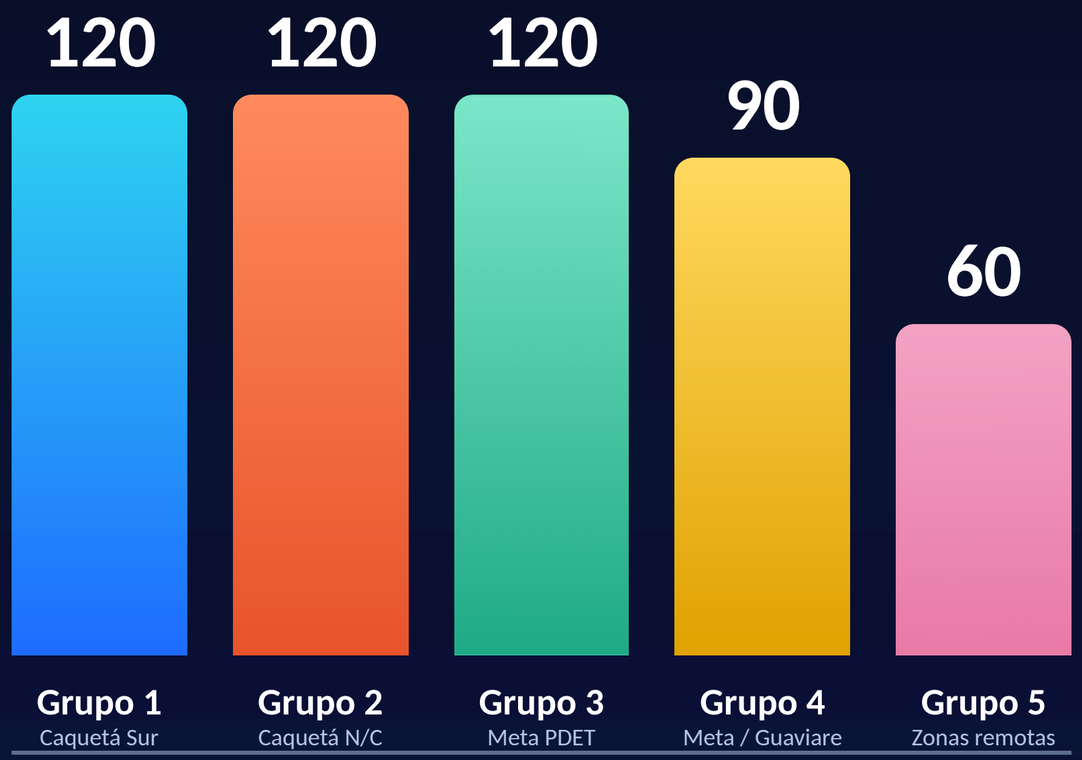

Grupo 1 Caquetá Sur · 4 municipios	San José del Fragua, Belén de los Andaquíes, Morelia y Florencia.
Grupo 2 Caquetá Norte/Centro · 4	El Paujil, Milán, Solita y San Vicente del Caguán.
Grupo 3 Meta PDET · 4 municipios	Uribe, Mesetas, Vistahermosa y Mapiripán.
Grupo 4 Meta / Guaviare · 3	Puerto Lleras, Puerto Rico y Puerto Concordia.
Grupo 5 Zonas remotas · 2	Miraflores (Guaviare) y La Macarena (Meta): municipios de difícil acceso geográfico y operativo.


Cohortes de 30 participantes por municipio · Distribución de los 510 líderes por grupo territorial

4 · ESQUEMA PEDAGÓGICO E INTENSIDAD HORARIA

40 horas por municipio, adaptadas a cada territorio

A · Esquema estándar

15 municipios · 70 % presencial / 30 % autónomo



Presencial · Autónomo guiado

- 2 jornadas de 2 días: 14 horas por jornada
- Dos semanas de intervalo entre sesiones
- 12 horas de trabajo autónomo con cartillas e instrumentos físicos

B · Zonas de difícil acceso

Miraflores y La Macarena · 50 % presencial / 50 % autónomo



Presencial · Autónomo acompañado

- 1 jornada intensiva concentrada de 3 días
- Acceso fluvial y aéreo condicionan la logística
- 20 horas autónomas con acompañamiento individual por canales directos

Misma calidad, distinta ruta: ambos esquemas suman 40 horas académicas y conducen a la misma certificación.

Intensidad horaria por esquema · 40 horas totales en ambos casos

4 · CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

Siete meses, cinco fases secuenciales



Mes de ejecución del convenio (0 a 7)

5 · MALLA CURRICULAR INTEGRADA

Cuatro módulos del aula al diálogo de saberes

MÓDULO 1

Liderazgo y organización comunitaria

Liderazgo comunitario, facilitación de conversaciones socioambientales y seguimiento participativo al ordenamiento del territorio.

MÓDULO 2

Gobernanza ambiental y gestión de proyectos

Instrumentos normativos ambientales en Colombia, roles institucionales y formulación de proyectos comunitarios sostenibles.

MÓDULO 3

Sostenibilidad y resolución de conflictos

Prevención y mediación de conflictos socioambientales y promoción de prácticas productivas agroecológicas.

MÓDULO 4

Planeación participativa y beneficios de la naturaleza

Servicios ecosistémicos y Plan de Acción Comunitario articulado con la Zonificación Ambiental Participativa (ZAP II).

Componente aplicado y cierre: taller vivencial de simulación y cartografía social en cada municipio, y entrega de certificaciones físicas y digitales con código QR (mínimo 60 % de asistencia).

5 · MEDICIÓN DE CAPACIDADES

Evaluación antes y después de la intervención

1

Evaluación diagnóstica de línea base

Medición al inicio del curso en cada municipio para establecer el conocimiento previo sobre normatividad, ordenamiento y gobernanza.

→

2

Evaluación de cierre y transferencia

Al finalizar el ciclo, mide de forma cuantitativa y cualitativa el incremento de competencias en los 510 líderes.

→

3

Trazabilidad individual

Sistematización en tiempo real de asistencia, calificaciones y entregas de trabajo autónomo.

Resultado: evidencia objetiva de la transformación de capacidades de cada líder, municipio por municipio.

6 · DIFERENCIAL TECNOLÓGICO

Panel de seguimiento con inteligencia artificial

A · Captura georreferenciada en campo

Los enlaces territoriales capturan asistencia, evidencias fotográficas y caracterización poblacional desde el celular, incluso con conectividad limitada.

→

B · Consolidación automatizada con IA

Modelos de IA procesan los datos y generan **borradores de informes de avance en máximo 3 días hábiles** tras cada jornada mensual.

→

C · Informes especializados

Una batería de informes de alta rigurosidad entregada al Instituto Humboldt para la supervisión del convenio.

Informe mensual de avance
Cobertura por municipio, por género, grupo etario, pertenencia étnica y discapacidad.

17 memorias comunitarias
510 ejemplares impresos con consensos ZAP, mapas locales y registro fotográfico.

Informe final consolidado
Lecciones aprendidas, capacidades, infografía de síntesis e indicadores de impacto.

6 · DIFERENCIAL TECNOLÓGICO · EL ECOSISTEMA DE DATOS

Un solo flujo: del dato en campo al informe radicado

1

Captura en campo

Se registran asistencia, avance y novedades desde el celular. Funciona sin conexión y sincroniza cuando hay señal.

→

2

Consolidación

Los registros de los 17 municipios se unifican y se cruzan con el cronograma de los 5 grupos y la intensidad horaria, de forma automática.

→

3

Borradores con IA

Informe mensual e informe financiero por jornada (Anexo No. 2) en borrador, con cifras tomadas de la base y revisión previa.

→

4

Panel y radicación

Se consulta el avance por municipio y grupo; el informe final se aprueba y se radica.

App de captura
Formularios simples para asistencia, avance y novedades, con fotos de soporte.

Panel del supervisor
Avance por municipio y grupo, cumplimiento de horas y alertas, con exportación a Excel.

Generador de informes
Plantillas del Anexo No. 2 que se llenan con los datos y se redactan con IA.

Protección de datos
Acceso por roles, respaldos diarios y tratamiento conforme a la Ley 1581 de 2012.

Principio: el sistema complementa los formatos oficiales del Instituto, no los reemplaza. Las cifras salen de los registros; la IA solo redacta la narrativa y todo pasa por revisión humana antes de radicarse.

6 · DIFERENCIAL TECNOLÓGICO · EL TRABAJO, ACTIVIDAD POR ACTIVIDAD

Detrás de un panel simple, tres fases de trabajo

FASE 1 · CONSTRUCCIÓN

Diseñar, construir y poner a prueba

01 Levantamiento
Anexo No. 2, formatos oficiales e indicadores que el supervisor necesita ver.

02 Modelo de datos y seguridad
Municipios, grupos, jornadas y asistentes; roles de acceso y protocolo de la Ley 1581.

03 App de captura móvil sin conexión
Asistencia, avance y novedades con fotos; guardado local y sincronización.

04 Panel del supervisor
Municipios y grupos, intensidad horaria, alertas de desvío y exportación a Excel.

05 Generador de informes
Plantillas del informe mensual y financiero, instrucciones de IA y validación de cada cifra contra la base.

06 Piloto en campo y ajustes
Prueba con datos reales de la primera jornada y corrección en terreno.

07 Capacitación y manual
Sesión para quienes capturan y consultan, más un manual corto de uso.

FASE 2 · OPERACIÓN MENSUAL

08 Calidad de datos y alertas
Revisión semanal de registros incompletos y alertas de cronograma.

09 Informe mensual
Borrador, verificación de cifras contra la base y ajuste de la narrativa.

10 Informes financieros por jornada
Borradores por cada jornada, consolidados para revisión.

11 Soporte y ajustes
Atención de fallas, dudas y ajustes menores dentro del alcance.

12 Corte mensual
Reunión corta para revisar avance, alertas y novedades.

FASE 3 · CIERRE

13 Entrega y cierre
Base de datos completa y exportaciones al Instituto, acta de entrega y cierre ordenado de accesos.

6 · DIFERENCIAL TECNOLÓGICO · CALENDARIO

Qué pasa cada mes en el ecosistema de datos

ACTIVIDAD	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	CIERRE
Construcción, piloto y capacitación	●						
Captura en campo y consolidación	●	●	●	●	●	●	
Revisión de calidad y alertas (semanal)		▮▮▮▮	▮▮▮▮	▮▮▮▮	▮▮▮▮	▮▮▮▮	
Borrador del informe mensual	●	●	●	●	●	●	
Informes financieros por jornada	●	●	●	●	●	●	
Corte de seguimiento y novedades	●	●	●	●	●	●	
Entrega de la base y acta de cierre							●

● Construcción ● Operación ● Cierre

Operando desde el primer mes: el sistema queda activo antes de que se acumulen jornadas sin registrar.

6 · DIFERENCIAL TECNOLÓGICO · ENTREGABLES

Lo que se entrega y cada cuánto

ENTREGABLE	DETALLE	FRECUENCIA
App de captura funcionando	Instalable en el celular del monitor, con funcionamiento sin conexión	**Una vez · mes 1**
Panel del supervisor	Acceso protegido, actualizado con cada sincronización	**Una vez · mes 1, activo toda la ejecución**
Manual de uso y capacitación	Sesión para quienes capturan y consultan	**Una vez · mes 1**
Aviso de privacidad y protocolo de datos	Ley 1581 de 2012	**Una vez · mes 1**
Reporte de alertas y consolidado	Desvíos de cronograma, asistencia e intensidad horaria	**Semanal**
Borrador del informe mensual	Cifras trazables a la base, listo para revisión	**Mensual**
Borradores del informe financiero por jornada	Formato del Anexo No. 2	**Por jornada · consolidado mensual**
Base de datos final y exportaciones	Excel/CSV completos y acta de entrega al Instituto	**Al cierre**

6 · DIFERENCIAL TECNOLÓGICO · COMPROMISOS

Lo que queda garantizado

Operando desde el mes 1

Con piloto en campo y capacitación realizados.

Atención de fallas

Las fallas que impidan capturar datos se atienden el mismo día hábil.

Ajustes y dudas

Respuesta en máximo 2 días hábiles.

Borrador del informe mensual

Dentro de los 3 días hábiles siguientes a cada corte.

Cifras trazables

Cada número del informe sale de un registro de la base; la IA no inventa ni calcula cifras.

Exportación a Excel

Disponible en cualquier momento, como respaldo de continuidad.

Respaldo diario

Respaldo diario de la base de datos.

Revisión humana

Todo informe se revisa y se aprueba antes de radicarse.

6 · DIFERENCIAL TECNOLÓGICO · INFRAESTRUCTURA

Todo lo técnico está incluido

Base de datos dedicada

Proyecto exclusivo para este contrato, separado de cualquier otro, con respaldos diarios.

Alojamiento y dominio seguro

App y panel publicados con certificado de seguridad en un subdominio propio.

Servicio de IA

Consumo del modelo de lenguaje para redactar los borradores de todos los informes.

Accesos por rol

Monitor y supervisor ven solo lo que les corresponde.

Propiedad de los datos

Los datos son del proyecto y se entregan completos al cierre. No se usan para entrenar modelos de IA.

Ley 1581 de 2012

Aviso de privacidad, consentimiento de los participantes y protocolo de tratamiento.

Sin contrataciones adicionales: servidores, licencias y servicios técnicos hacen parte del ecosistema.

7 · ENTREGABLES DIDÁCTICOS, AUDIOVISUALES Y DE APROPIACIÓN SOCIAL

Piezas que se quedan en el territorio

2

Videos pedagógicos

De 3 a 5 minutos cada uno, con locución profesional en voz en off y subtitulado completo, para sintetizar los aprendizajes clave.

1

Infografía de síntesis

Mapa gráfico del programa con los marcos conceptuales y normativos, impreso para entrega individual a los 510 líderes.

17

Memorias comunitarias impresas

Una por municipio, en papel ecológico: 510 ejemplares con la memoria gráfica y conceptual del proceso ZAP II.

510

Certificaciones verificables

Certificados individuales físicos y digitales, validados con código QR institucional.

8 · OPERACIÓN LOGÍSTICA EN CAMPO

Logística digna y eco-sostenible en la Amazonía y la Orinoquía

Catering sostenible sin icopor

Desayunos, almuerzos y refrigerios AM/PM en vajilla biodegradable. Prohibido el icopor y los plásticos de un solo uso.

Hospedaje veredal y cenas de pernocte

Alojamiento y cenas desde la noche anterior para quienes llegan desde veredas lejanas a las cabeceras municipales.

Transporte y movilidad territorial

Desplazamientos fluviales y terrestres por vías terciarias, con esquemas de transporte local legalizados.

Infraestructura para capacitación

Salones con ventilación, iluminación natural y sistemas audiovisuales en los 17 municipios.

Principio de operación: cada decisión logística protege el ambiente que el programa busca cuidar.

9 · PRESUPUESTO CONSOLIDADO Y PROPUESTA ECONÓMICA GLOBAL

Una inversión de $1.086.430.500 para siete meses

COMPONENTE / RUBRO	SUBTOTAL	IVA	TOTAL CON IVA
1. Componente académico, pedagógico y curricular	$680.650.000	$0 (exento)	$680.650.000
2. Operación logística fija en campo (alimentación y salones)	$110.500.000	$20.995.000	$131.495.000
3. Cenas para pernocte de participantes veredales	$16.650.000	$3.163.500	$19.813.500
4. Alojamiento en municipios para zonas lejanas	$88.800.000	$16.872.000	$105.672.000
5. Transporte y movilidad de participantes	$148.800.000	$0 (reembolso)	$148.800.000
VALOR TOTAL GLOBAL DE LA PROPUESTA	**$1.045.400.000**	**$41.030.500**	**$1.086.430.500**



Componente académico (exento)	65 %
Transporte y movilidad	14 %
Logística fija en campo	11 %
Alojamiento zonas lejanas	8 %
Cenas de pernocte veredal	2 %

Cifras en pesos colombianos (COP) · Composición del presupuesto por componente

9 · ASPECTOS TRIBUTARIOS Y COMERCIALES

Tratamiento tributario y forma de pago

Componente académico
Excluido de IVA por el Art. 476, num. 6 del Estatuto Tributario: educación de Instituciones de Educación Superior reconocidas.

Componente logístico
Catering y alojamiento aplican la **tarifa general del 19 % de IVA**.

Transporte
Reembolso directo de costos, **sin IVA**.

Estabilidad tarifaria
Tarifas unitarias y totales **fijas e invariables** durante los 7 meses del convenio.

FORMA DE PAGO PROPUESTA

30 %
$325.929.150
Anticipo inicial, a la firma del convenio y previa aprobación de la garantía única.

40 %
$434.572.200
Pago por avance, contra el informe de los primeros 3 grupos de municipios.

30 %
$325.929.150
Pago final, contra informe final consolidado, 17 memorias impresas y certificados de los 510 líderes.

Porcentajes sobre el valor total global de $1.086.430.500

10 · GESTIÓN DE RIESGOS Y ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

Cada riesgo con su medida verificable

RIESGO / FACTOR CRÍTICO	MEDIDA DE MITIGACIÓN
Accesibilidad limitada en Miraflores y La Macarena	Esquema especial 50/50 (20 h + 20 h), jornada intensiva de 3 días y acompañamiento individual remoto.
Dispersión territorial en 17 municipios	Monitor o enlace territorial permanente en cada municipio y logística diferenciada por subregión.
Oportunidad y calidad de la información de avance	Captura georreferenciada y consolidación con IA; borradores de informe en máximo 3 días hábiles.
Baja asistencia o deserción	Mínimo 60 % de asistencia para certificar, trazabilidad individual y hospedaje y cenas garantizados.
Imprevistos logísticos (transporte fluvial y terrestre)	Esquemas locales legalizados y tarifas unitarias fijas e invariables durante los 7 meses.

Evaluación en dos tiempos
Línea base y cierre en cada municipio.

Supervisión documental continua
Informes validados antes de cada desembolso.

Respaldo institucional
Dirección de Brigitte Baptiste y Alta Calidad.

11 · FIRMA Y RESPALDO INSTITUCIONAL

Formar 510 líderes es sembrar gobernanza ambiental en el territorio

POSTULACIÓN INSTITUCIONAL
Universidad EAN, acreditada en Alta Calidad

PARA
Instituto Alexander von Humboldt

DIRECCIÓN CIENTÍFICA
Brigitte Baptiste
Bogotá D.C., 13 de octubre de 2026

ANEXO

Referencias

Congreso de Colombia. (1989). *Estatuto Tributario Nacional*, Decreto 624 de 1989, artículo 476, numeral 6.

Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior [Fiducoldex], Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz. (2025). *Convenio No. 123 de 2025* suscrito con el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt.

Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt. (2026). *Anexo No. 2 — Descripción de la necesidad. Convenio 25-101 FPV ZAP II.*

Ministerio de Educación Nacional de Colombia. (2021). *Resolución 023654 — Acreditación en Alta Calidad, Universidad EAN.*

Universidad EAN. (2026). *Propuesta técnica, metodológica y económica global — Curso de Liderazgo para el Diálogo Ambiental y la Sostenibilidad Territorial (ZAP II).*
